

EVOLUȚIA DPV. EC. A CONTRACTELOR DE EXECUȚIE DIN DOMENIUL INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT

Material pregătit pe baza informațiilor furnizate de
către Direcția Generală Tehnică

01.08.2022.


EVOLUȚIA DPV. EC. A CONTRACTELOR DE EXECUȚIE DIN DOMENIUL INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT

CRESTERI PREȚURI	LEI	%
BETON	230-450	196%
FIER	2,2-6,4	290%
PIATRA	19-26	136%
ASFALT	190-330	174%

VALOARE CONTRACTATA INVESTITIE 2020 (MII LEI)	155251,3
VALOARE INVESTITIE 2022 (MII LEI)	164049,1
DIFERENTA (MII LEI)	8797,83
CRESTERE (%)	5,67%

OBIECTIVE DE INVESTIȚII	VALOARE CONTRACTATA INVESTITIE 2020 (MII LEI)	VALOARE INVESTITIE 2022 (MII LEI)	DIFERENTA (MII LEI)	CRESTERE
Reabilitare DJ 123	35567,1	37581,51	2014,41	5,7%
Reabilitare DJ 127	41835,7	43899,47	2063,77	4,9%
Reabilitare DJ 127A	19048,52	19048,52	0	0,0%
Modernizare DJ 135	30285,47	33099,81	2814,34	9,3%
Consolidare DJ 136B	28514,48	30419,79	1905,31	6,7%
	155251,27	164049,1	8797,83	5,7%

EVOLUȚIA DPV. EC. A CONTRACTELOR DE EXECUȚIE DIN DOMENIUL INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT

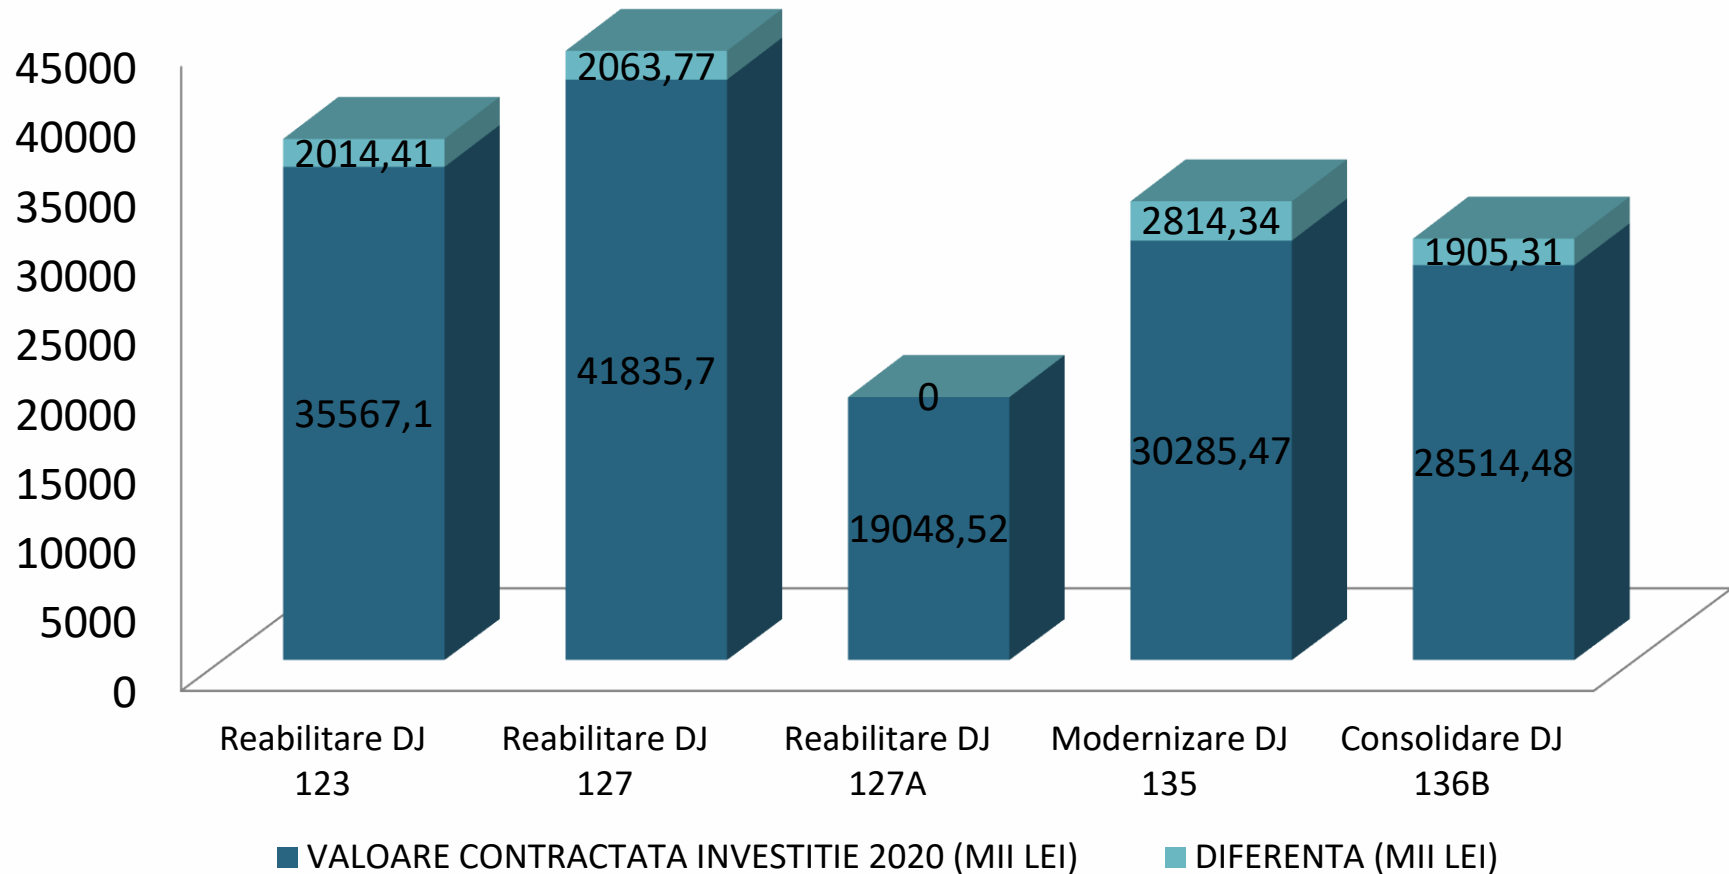

EVOLUȚIA DPV. EC. A CONTRACTELOR DE EXECUȚIE DIN DOMENIUL INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT

	MII LEI CU TVA
FONDURI NECESARE DE LA DATA PREZENTEI PÂNĂ LA 31.12.2022.	20 875,50
SE ESTIMEAZĂ O CREȘTERE A SUMELOR DE PLATĂ CU 35%, ADICĂ:	7 306,43
AJUSTĂRI ESTIMATE PÂNĂ LA 31.12.2022.	
AJUSTĂRI PÂNĂ LA DATA PREZENTEI	8 797,82
AJUSTĂRI AFERENTE SUMELOR CARE URMEAZĂ SĂ FIE FACTURATE DE LA DATA PREZENTEI PÂNĂ LA 31.12.2022 (CREȘTERE ESTIMATĂ DE 35%)	7 306,43
TOTAL AJUSTĂRI	16 104,25

EVOLUȚIA DPV. EC. A CONTRACTELOR DE EXECUȚIE DIN DOMENIUL INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT

Nr. crt.	Denumire investiție	Fonduri alocate 2020		Fonduri achitate 2020		Fonduri alocate 2021		Fonduri achitate 2021		Fonduri alocate 2022		Fonduri achitate/facturate/situații depuse 2022	
		Valoarea TOTALĂ a fondurilor	Natura fondurilor VP FRC CI	Valoarea TOTALĂ a fondurilor	Natura fondurilor VP FRC CI	Valoarea fondurilor TOTAL	Natura fondurilor VP FRC CI	Valoarea TOTALĂ a fondurilor	Natura fondurilor VP FRC CI	Valoarea fondurilor TOTAL	Natura fondurilor VP FRC CI	Valoarea TOTALĂ a fondurilor	Natura fondurilor VP FRC CI
1	Reabilitare DJ 123, km 7+000 - 21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7+900-7+940 și reparația a 4	5.704,00	4.391,89	2.076,61	764,50	5.346,88	789,88	4.587,24	534,56	5.802,34	4.511,00	9.580,38	6.655,62
			1.312,11		1.312,11		2.557,00		2.373,99		0,00		1.312,11
			0,00		0,00		2.000,00		1.678,69		1.291,34		1.612,65
2	Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500	1.807,72	1.807,72	1.799,75	1.799,75	6.894,00	3.894,00	6.894,00	3.894,00	7.388,03	5.137,80	6.313,62	4.063,39
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		3.000,00		3.000,00		2.250,23		2.250,23
3	Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația / reconstrucția /refacerea lucrărilor	13.114,16	5.823,29	9.238,69	1.947,82	8.183,75	269,43	5.821,02	152,89	3.580,81	1.351,48	2.845,48	616,15
			7.290,87		7.290,87		7.714,32		5.668,13		2.229,33		2.229,33
			0,00		0,00		200,00		0,00		0,00		0,00
4	Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500	1.910,00	1.910,00	1.874,16	1.874,16	9.629,00	6.629,00	9.080,27	6.080,27	13.457,74	11.547,00	12.942,13	11.031,39
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		3.000,00		3.000,00		1.910,74		1.910,74
5	Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200	1.300,00	0,00	0,00	0,00	8.814,80	4.514,80	8.814,38	4.514,38	3.392,00	3.392,00	390,61	390,61
			1.300,00		0,00		1.300,00		1.300,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		3.000,00		3.000,00		0,00		0,00
TOTAL		23.835,88		14.989,21		38.868,43		35.196,91		33.620,92		32.072,22	

Din valoarea totala de 32.072,22 mii lei cu TVA, valoarea facturilor emise in anul 2021 reprezinta 18.841,32 mii lei cu TVA

Diferenta dintre valoarea alocata in anul 2022 si valoarea achitata/facturata/a situatiilor depuse este de 1.548,70
