Grafic Gantt- Reabilitarea si modernizarea Centrului de Sanatate Sanmartin
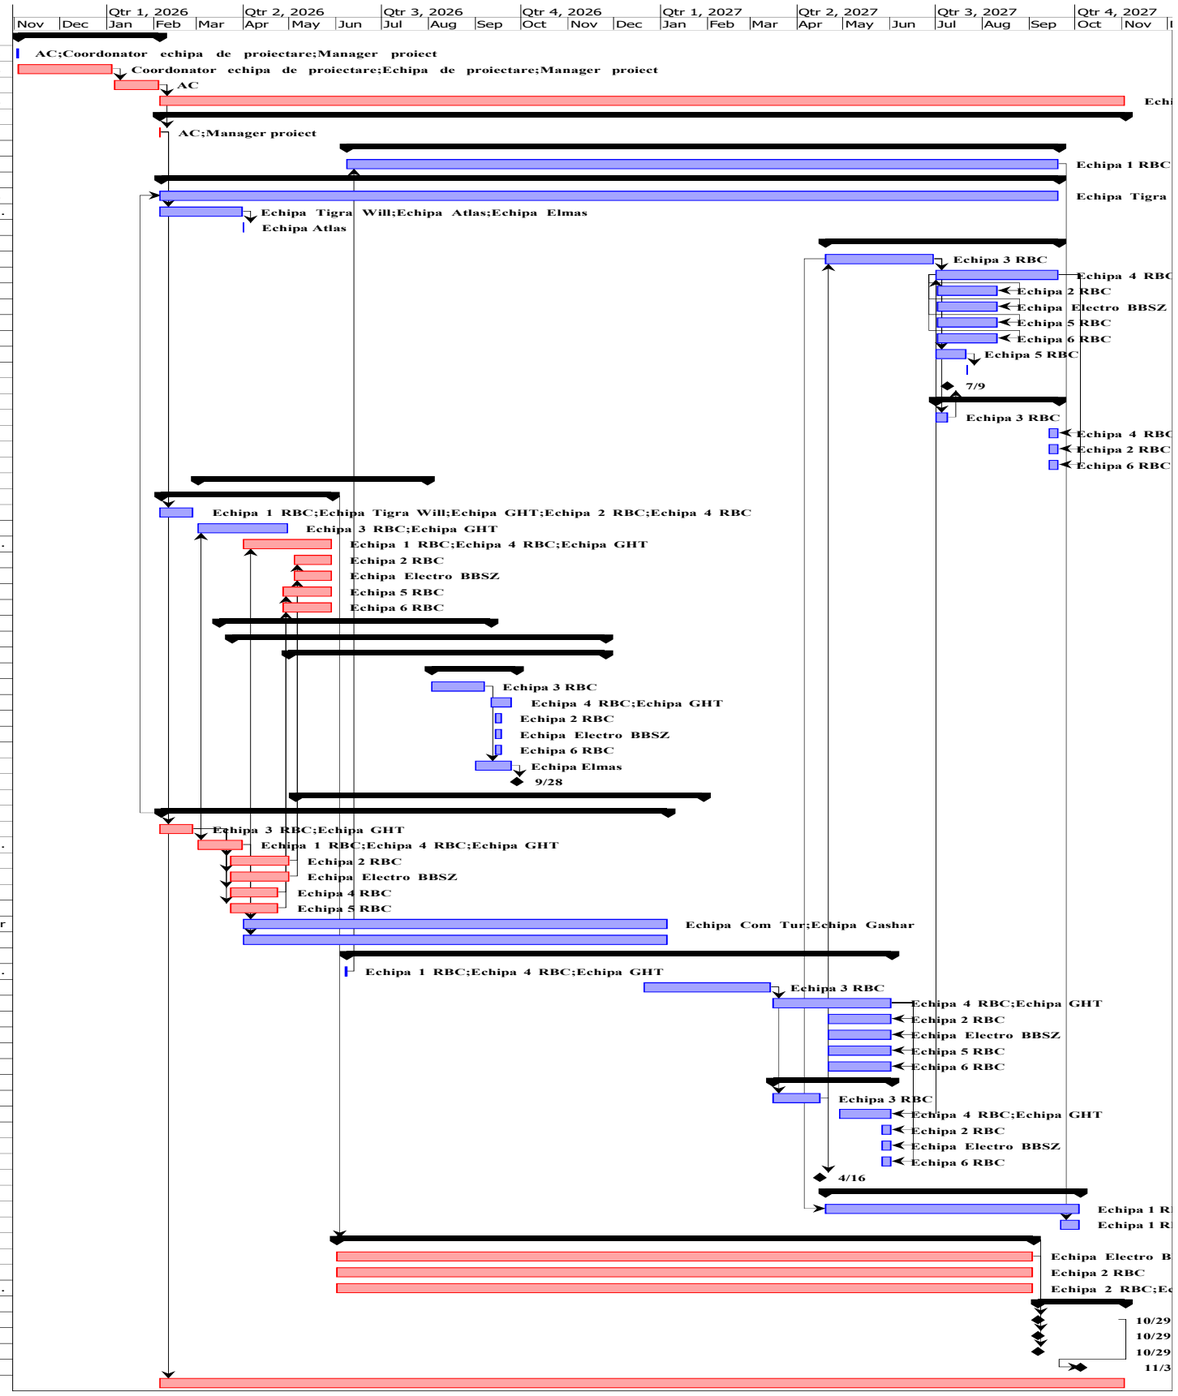
	Name	Duration	Start	Finish	Predec...	Resource Names
1	**Proiectare**	**68 days?**	**11/3/25 8:00 AM**	**2/4/26 5:00 PM**		
2	Ordin de incepere- proiectare	0.333 days?	11/3/25 8:00 AM	11/3/25 10:40 AM		AC;Coordonator echipa de ...
3	Elaborare PT+DDE	46 days?	11/3/25 8:00 AM	1/5/26 5:00 PM		Coordonator echipa de proi...
4	Revizuire / verificare proiect si av...	22 days?	1/6/26 8:00 AM	2/4/26 5:00 PM	3	AC
5	Asistenta tehnica a proiectantului p...	455 days?	2/5/26 8:00 AM	11/3/27 5:00 PM	4	Echipa de proiectare;Coord...
6	**Executie**	**455 days?**	**2/5/26 8:00 AM**	**11/3/27 5:00 PM**		
7	Ordin de incepere- executie	0.5 days?	2/5/26 8:00 AM	2/5/26 1:00 PM	4	AC;Manager proiect
8	**Amenajarea terenului**	**335.667 da...**	**6/8/26 10:40 AM**	**9/20/27 5:00 PM**		
9	Drenaj, trotuar de protectie	335.667 days?	6/8/26 10:40 AM	9/20/27 5:00 PM	93	Echipa 1 RBC
10	**Devieri retele de utilitati**	**422.5 days?**	**2/5/26 1:00 PM**	**9/20/27 5:00 PM**		
11	Protejarea/devierea utilitatilor ...	422.5 days?	2/5/26 1:00 PM	9/20/27 5:00 PM	83SS	Echipa Tigra Will;Echipa 2 R...
12	Bransamente noi/modificarea b...	38.5 days	2/5/26 1:00 PM	3/31/26 5:00 PM	7	Echipa Tigra Will;Echipa Atla...
13	M4G- Bransament gaze validat ...	1 day?	4/1/26 8:00 AM	4/1/26 5:00 PM	12	Echipa Atlas
14	**Cladire C0**	**111 days?**	**4/19/27 8:00 AM**	**9/20/27 5:00 PM**		
15	Structura de rezistenta	53 days?	4/19/27 8:00 AM	6/30/27 5:00 PM	101	Echipa 3 RBC
16	Arhitectura	58 days?	7/1/27 8:00 AM	9/20/27 5:00 PM	15;102	Echipa 4 RBC;Echipa GHT
17	Instalatii electrice curenti tari	29 days?	7/2/27 8:00 AM	8/11/27 5:00 PM	16SF...	Echipa 2 RBC
18	Instalatii electrice curenti slabi	29 days	7/2/27 8:00 AM	8/11/27 5:00 PM	16SF...	Echipa Electro BBSZ
19	Instalatii sanitare	29 days	7/2/27 8:00 AM	8/11/27 5:00 PM	16SF...	Echipa 5 RBC
20	Instalatii termice si ventilare	29 days	7/2/27 8:00 AM	8/11/27 5:00 PM	16SF...	Echipa 6 RBC
21	Montaj utilaje - statie de tratar...	15 days	7/1/27 8:00 AM	7/21/27 5:00 PM	15	Echipa 5 RBC
22	Lista echipamente- statie de tr...	1 day?	7/22/27 8:00 AM	7/22/27 5:00 PM	21	
23	M2- fundatii & structura pavilion	1 day?	7/9/27 8:00 AM	7/9/27 5:00 PM	25FS-...	
24	**Corp de legatura C0-C2**	**58 days?**	**7/1/27 8:00 AM**	**9/20/27 5:00 PM**		
25	Structura de rezistenta	7 days?	7/1/27 8:00 AM	7/9/27 5:00 PM	15	Echipa 3 RBC
26	Arhitectura	5 days	9/14/27 8:00 AM	9/20/27 5:00 PM	16FF	Echipa 4 RBC;Echipa GHT
27	Instalatii electrice curenti tari	5 days	9/14/27 8:00 AM	9/20/27 5:00 PM	16FF	Echipa 2 RBC
28	Instalatii termice si ventilare	5 days	9/14/27 8:00 AM	9/20/27 5:00 PM	16FF	Echipa 6 RBC
29	**Cladire C1.1 neeligibil**	**110 days?**	**3/2/26 8:00 AM**	**7/31/26 5:00 PM**		
37	**Cladire C1.2 + C1.3 neeligibil**	**81.5 days?**	**2/5/26 1:00 PM**	**5/29/26 5:00 PM**		
38	Demolari	16.5 days?	2/5/26 1:00 PM	2/27/26 5:00 PM	7	Echipa 1 RBC;Echipa Tigra ...
39	Structura de rezistenta- camas...	44 days?	3/2/26 8:00 AM	4/30/26 5:00 PM	84	Echipa 3 RBC;Echipa GHT
40	Arhitectura- termoizolare int., f...	43 days?	4/1/26 8:00 AM	5/29/26 5:00 PM	85	Echipa 1 RBC;Echipa 4 RBC;...
41	Instalatii electrice curenti tari	20 days?	5/4/26 8:00 AM	5/29/26 5:00 PM	86	Echipa 2 RBC
42	Instalatii electrice curenti slabi	20 days?	5/4/26 8:00 AM	5/29/26 5:00 PM	87	Echipa Electro BBSZ
43	Instalatii sanitare	25 days?	4/27/26 8:00 AM	5/29/26 5:00 PM	88	Echipa 5 RBC
44	Instalatii termice si ventilare	25 days?	4/27/26 8:00 AM	5/29/26 5:00 PM	89	Echipa 6 RBC
45	**Cladire C1.4**	**129.333 da...**	**3/16/26 8:00 AM**	**9/11/26 10:40 A...**		
53	**Cladire C1.5**	**177 days?**	**3/24/26 8:00 AM**	**11/25/26 5:00 PM**		
61	**Corp legatura C1.4-C1.5**	**149 days?**	**5/1/26 8:00 AM**	**11/25/26 5:00 PM**		
67	**Cladire C1.5, Cladire ascensor**	**41 days?**	**8/3/26 8:00 AM**	**9/28/26 5:00 PM**		
68	Structura de rezistenta	26 days?	8/3/26 8:00 AM	9/7/26 5:00 PM	47	Echipa 3 RBC
69	Arhitectura	10.667 days?	9/11/26 10:40 AM	9/25/26 5:00 PM	48	Echipa 4 RBC;Echipa GHT
70	Instalatii electrice curenti tari	5 days?	9/12/26 8:00 AM	9/18/26 5:00 PM	49FS...	Echipa 2 RBC
71	Instalatii electrice curenti slabi	5 days?	9/12/26 8:00 AM	9/18/26 5:00 PM	50FS...	Echipa Electro BBSZ
72	Instalatii termice si ventilare	5 days?	9/12/26 8:00 AM	9/18/26 5:00 PM	51FS...	Echipa 6 RBC
73	Montaj lift	19 days?	9/1/26 8:00 AM	9/25/26 5:00 PM	68FS-...	Echipa Elmas
74	M3-Montaj lift exterior	1 day?	9/28/26 8:00 AM	9/28/26 5:00 PM	73	
75	**Cladire C2**	**194 days?**	**5/5/26 8:00 AM**	**1/29/27 5:00 PM**		
83	**Cladire C2, centrala termica**	**238.5 days?**	**2/5/26 1:00 PM**	**1/5/27 5:00 PM**		
84	Structura de rezistenta	16.5 days?	2/5/26 1:00 PM	2/27/26 5:00 PM	7	Echipa 3 RBC;Echipa GHT
85	Arhitectura	22 days?	3/2/26 8:00 AM	3/31/26 5:00 PM	84	Echipa 1 RBC;Echipa 4 RBC;...
86	Instalatii electrice de curenti tari	30 days?	3/21/26 8:00 AM	5/1/26 5:00 PM	84FS...	Echipa 2 RBC
87	Instalatii electrice curenti slabi	30 days?	3/21/26 8:00 AM	5/1/26 5:00 PM	84FS...	Echipa Electro BBSZ
88	Instalatii sanitare	25 days?	3/21/26 8:00 AM	4/24/26 5:00 PM	84FS...	Echipa 4 RBC
89	Instalatii termice si ventilare	25 days?	3/21/26 8:00 AM	4/24/26 5:00 PM	84FS...	Echipa 5 RBC
90	Montaj CT	200 days	4/1/26 8:00 AM	1/5/27 5:00 PM	85	Echipa Com Tur;Echipa Gashar
91	Lista echipamente -CT	200 days	4/1/26 8:00 AM	1/5/27 5:00 PM	85	
92	**Cladire C3**	**258 days?**	**6/8/26 8:00 AM**	**6/2/27 5:00 PM**		
93	Demolari	0.333 days?	6/8/26 8:00 AM	6/8/26 10:40 AM	76	Echipa 1 RBC;Echipa 4 RBC;...
94	Structura de rezistenta- placa ...	61 days?	12/21/26 8:00 AM	3/15/27 5:00 PM	77	Echipa 3 RBC
95	Arhitectura- termosistem ext., ...	57 days?	3/16/27 8:00 AM	6/2/27 5:00 PM	94	Echipa 4 RBC;Echipa GHT
96	Instalatii electrice de curenti tari	31 days?	4/21/27 8:00 AM	6/2/27 5:00 PM	95FF	Echipa 2 RBC
97	Instalatii electrice de curenti slabi	31 days	4/21/27 8:00 AM	6/2/27 5:00 PM	95FF	Echipa Electro BBSZ
98	Instalatii sanitare	31 days	4/21/27 8:00 AM	6/2/27 5:00 PM	95FF	Echipa 5 RBC
99	Instalatii termice si ventilare	31 days	4/21/27 8:00 AM	6/2/27 5:00 PM	95FF	Echipa 6 RBC
100	**Cladire C3'**	**57 days?**	**3/16/27 8:00 AM**	**6/2/27 5:00 PM**		
101	Structura de rezistenta	24 days?	3/16/27 8:00 AM	4/16/27 5:00 PM	94	Echipa 3 RBC
102	Arhitectura	25 days	4/29/27 8:00 AM	6/2/27 5:00 PM	95FF	Echipa 4 RBC;Echipa GHT
103	Insalatii electrice de curenti tari	5 days	5/27/27 8:00 AM	6/2/27 5:00 PM	95FF	Echipa 2 RBC
104	Instalatii electrice de curenti slabi	5 days	5/27/27 8:00 AM	6/2/27 5:00 PM	95FF	Echipa Electro BBSZ
105	Instalatii termice si ventilare	5 days	5/27/27 8:00 AM	6/2/27 5:00 PM	95FF	Echipa 6 RBC
106	M1- final consolidare C1-C3, co...	1 day	4/16/27 8:00 AM	4/16/27 5:00 PM	101F...	
107	**Lucrari exterioare**	**121 days?**	**4/19/27 8:00 AM**	**10/4/27 5:00 PM**		
108	Amenajarea terenului- acces v...	121 days?	4/19/27 8:00 AM	10/4/27 5:00 PM	15SS	Echipa 1 RBC
109	Reparatii gard existent	10 days?	9/21/27 8:00 AM	10/4/27 5:00 PM	9	Echipa 1 RBC
110	**Montaj utilaj inst. electrice, I...**	**330 days?**	**6/1/26 8:00 AM**	**9/3/27 5:00 PM**	**37**	
111	Lista echipamente- IDSAI, PSI	330 days?	6/1/26 8:00 AM	9/3/27 5:00 PM		Echipa Electro BBSZ
112	Lista echipamente- inst. ventilare	330 days?	6/1/26 8:00 AM	9/3/27 5:00 PM		Echipa 2 RBC
113	Lista echipamente- inst. pt stin...	330 days?	6/1/26 8:00 AM	9/3/27 5:00 PM		Echipa 2 RBC;Echipa Electro...
114	**Probe si receptie**	**43 days**	**9/6/27 8:00 AM**	**11/3/27 5:00 PM**		
115	M4- PIF CT & retele termice	40 days	9/6/27 8:00 AM	10/29/27 5:00 PM	110	
116	M5- PIF instalatii PSI/IDSAI	40 days	9/6/27 8:00 AM	10/29/27 5:00 PM	111	
117	M6- ATR&PIF tablouri electrice	40 days	9/6/27 8:00 AM	10/29/27 5:00 PM	110	
118	M7- Receptie la terminarea lucr...	23 days	10/4/27 8:00 AM	11/3/27 5:00 PM	115F...	AC;Coordonator echipa de ...
119	Organizare de santier	454.5 days?	2/5/26 1:00 PM	11/3/27 5:00 PM	7	Echipa 7 RBC
